

## Bilag 2.e.a

### Afsluttende rapport for initiativ 9.2: "VIDERE MED FÆLLES LOG-IN OG FULDMAGTER"

#### Stamdata

Initiativnavn	VIDERE MED FÆLLES LOG-IN OG FULDMAGTER
Ministerium	Finansministeriet
Institution	Digitaliseringsstyrelsen
Budget og finansiering	110 mio. kr.
Ansvarlig for statusrapportering	Kenneth Mose Kruuse
Formand for følge-/arbejdsgruppe	Morten Mejer-Warnich
Projektleder	Kenneth Mose Kruuse
Projektejer	Morten Mejer-Warnich
Programleder	Thomas Holmstrøm Frandzen
Starttidspunkt	15. marts 2010
Sluttidspunkt	30. juni 2014
Øvrige kommentarer	-

#### Resultater

I perioden 15. marts 2010 til 30. juni 2014, er der gennemført udbud og implementering af de samlede leverancer af NemLog-in 2 kontrakten incl. option om en fuldmagtskomponent. Der har været tale om en trinvis idriftsættelse af kontraktens leverancer, hvor den første leverance fandt sted januar 2013 og sidste leverance juni 2014. Kontrakten omfatter følgende leverancer:

Projektets mål	Succeskriterie	Opfyldelse (omfang)
<b>1. Idriftsættelse af NemLog-in 2</b>	Overgang uden det bemærkes af brugerne	100 %
<b>2. Idriftsættelse af fællesoffentlig brugerrettighedsstyringskomponent</b>	Datakonvertering og bagudkompatibilitet til VIRK.DK	100 %
<b>3. Idriftsættelse af fællesoffentlig signeringkomponent</b>	Fuld brugbar komponent – til dels til afløsning af den før benyttede	100 %
<b>4. Idriftsættelse af Customer Service System</b>	Lancering af automatiseret tilslutning med mulighed for større selvbetjening	100 %

<b>5. Idriftsættelse af Security Token System</b>	Lancering af mulighed for dataudveksling mellem myndigheder på baggrund af lokale billetter, der kan veksles i NemLog-in	100 %
<b>6. Idriftsættelse af Fuldmagt</b>	Lancering af fællesoffentlig fuldmagtskomponent	100 %

I den oprindelige tidplan for projektet indgik at den sidste leverance skulle finde sted medio 2012.

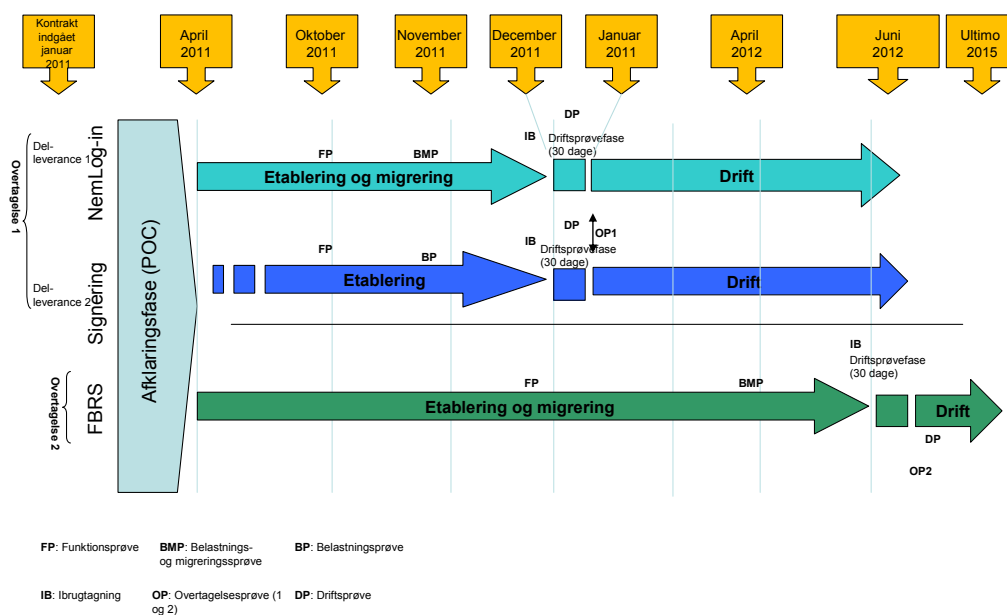


Fig. 1 Oprindelig tidsplan for initiativ 9.2

Forsinkelsen skyldes primært tekniske udfordringer og en større kompleksitet i integrationen mellem løsningens komponenter end leverandøren havde forudset. Digitaliseringsstyrelsen ændrede herudover undervejs på omfang og prioritering af kontraktens leverancer. I den oprindelige tidsplan indgik initiativ 9.2.b ”Fuldmagt” ikke. Implementering af fuldmagtskomponenten forløb over seks måneder, men impact på tidsplan er tre måneder. Grundet den forlængede implementeringsfase valgte Digitaliseringsstyrelsen af hensyn til understøttelse af mobile enheder i NemLog-in, at udskyde den sidste kontraktleverance. Dette forsinkede den endelige implementering af kontraktens samlede leverancer. Der er samlet tale om forsinkelse på ti måneder af kontraktens leverancer.

## Økonomi

Initiativet er finansieret fællesoffentligt med en FFL bevilling på 110 mio. kr.

Budgettet for etablering udgør 30 mio. kr., som angivet til Folketingets FIVU udvalg i december 2011<sup>1</sup>. De samlede etableringsomkostninger er revideret i sag af 24. april 2014, hvor de samlede udgifter til etablering opgøres til 31,5 mio. kr., hvilket udgør en overskridelse på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige estimat. Dette tilskrives det forlængede projektføreløb.

Initiativets budget i realiseringsfasen 2014 til 2018:

Rækkenavne	Sum af 2014	Sum af 2015	Sum af 2016	Sum af 2017	Sum af 2018
NemLogin – Drift	17,3	14,3	13,8	13,8	13,8
Intern afregning (Løn og overhead)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Øvrig drift	14,5	11,5	11,0	11,0	11,0
Fuldmagt – Drift	0,5	0,1			
Øvrig drift	0,5	0,1			
Forbedringer 2014/2015	4,2	5,6	5,8	5,5	5,3
Afskrivninger	3,5	4,7	5,1	5,1	5,1
Renter	0,7	0,9	0,7	0,4	0,2
Fuldmagt	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2
Afskrivninger	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Renter	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
NemLogin mobiløsning	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Afskrivninger	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Renter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Hovedtotal</b>	<b>23,8</b>	<b>21,9</b>	<b>21,4</b>	<b>21,0</b>	<b>20,7</b>

## Fremtidigt ejerskab

I 2013 er der gennemført en række stabiliseringstiltag, hvor der er investeret for i alt 1,3 mio. kr. i den fællesoffentlige brugerrettighedsstyringskomponent for at nedbringe behovet for support. Derudover er der i 2014 foretaget ændringer af hensyn til udfasning af Digital signatur, understøttelse af mobile enheder<sup>2</sup> og funktionalitet af hensyn til Grunddata programmet<sup>3</sup>.

	2014	2015
NemLogin mobiløsning		2.243.386
NemLogin mobil medarbejdersignatur		657.900
NemLogin - Udvikling 2014		7.035.292
NemLogin - Udvikling 2015		1.255.500
<b>Investeringer i alt</b>		<b>11.192.077</b>

<sup>1</sup> Fremgår af svar til Folketingets FIVU udvalg på spørgsmål 83 fra december 2011.

<sup>2</sup> Finansiering sker delvist via initiativ 9.1: "SIKKER DIGITAL SELVBETJENING PÅ MOBILEN", hvor der blev afsat 1.4 mio. kr. til mobilunderstøttelse i NemLog-in.

<sup>3</sup> Bidrager til businesscase for initiativ 10 "FÆLLES GRUNDDATA FOR ALLE MYNDIGHEDER"

For fuldmagtskomponenten er der igangsat et udbredelsesarbejde, der løber i 2015 og har som formål at:

1. oplyse myndigheder med relevante bølgeløsninger om mulighederne i fuldmagtskomponenten
2. indsamle, afklare og prioritere myndigheders behov for eventuel videreudvikling af fuldmagtskomponenten

Digitaliseringsstyrelsen står for udbredelsesarbejdet på det statslige område og arbejder sammen med KL om at analysere muligheden for videre udbredelse af fuldmagtskomponenten til kommunale selvbetjeningsløsninger.

Det er myndighedernes ansvar, på baggrund af en konkret vurdering, at stå for den tekniske implementering af fuldmagtskomponenten.

Der er ikke lovkrav om, at myndigheder skal anvende NemLog-ins fuldmagtskomponent.
