

NOTAT

14. marts 2015
/TGR

Sag
2015-1208

Bilag - afrapportering af initiativ 2.2 a. "Virksomhedernes egen side på Virk.dk"

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.2 a.	
Initiativnavn	Virksomhedernes egen side på Virk.dk
Ministerium	Erhvervs- og Vækstministeriet
Institution	Erhvervsstyrelsen
Ansvarlig for statusrapportering	Torsten Grunwald
Projektleder	Birgitte Førster
Projektejer	Carsten Ingerslev
Programleder	Carsten Ingerslev
Starttidspunkt	1.03.2012
Sluttidspunkt	31.12.2015

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00
Fax 35 29 10 01
CVR-nr 10 15 08 17
E-post erst@erst.dk
www.erst.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Baggrund

I arbejdet med at lette virksomhedernes administrative byrder i kommunikationen med det offentlige og skabe endnu bedre vilkår for vækst har det været et ønske at forandre Virk, så informationer fra det offentlige, fx frister for indberetning, i højere grad bliver tilpasset den enkelte virksomhed. Derfor skabtes initiativ 2.2 a. i Digitaliseringsstrategien 2011-2015, hvori der bevilliges finansiering til udvikling af "Virksomhedernes egen side på Virk", også kaldet Mit Virk.

Resultater

Forberedelser af Mit Virk (Virksomhedernes egen side på Virk.dk) begyndte primo 2012. Det blev dengang besluttet at udvikle Mit Virk i etaper frem mod 2016. Status er i dag, at en virksomhed bliver betjent personaliseret, så snart den er logget ind på Virk. Virksomheden får således informationer fra offentlige myndigheder, der er relevant for den, baseret på virksomhedens CVR-nummer og i nogle tilfælde den specifikke brugers medarbejdersignatur. Andelen af besøg på Mit Virk er gradvis steget siden første udgave af Mit Virk i 2012, og tendensen viser en voksende andel fremover. I 2015 indbefattede 26 pct. af besøgene på Virk et besøg på Mit Virk, hvilket svarer til knap 2,6 mio. besøg på Mit Virk og tjenester i 2015.

Mit Virk har ultimo 2015 10 personaliserede tjenester, der kan bidrage til virksomhedernes overblik over kommunikationen med det offentlige og bidrage til at åbne for vækstmuligheder. De 10 tjenester til virksomheder er baseret på en ny teknologisk open source-plattform og omhandler:

- Virksomhedens CVR-oplysninger, herunder mulighed for at rette i dem
- Digital Post fra myndigheder med notifikation om ny post
- Kalender med blandt andet frister for indberetning
- Beskeder om relevante begivenheder
- Som selskab adgang til eget aktuelt regnskab og historiske regnskaber i Erhvervsstyrelsen i forskellige formater, herunder XBRL (strukturerede data) og pdf
- Evt. sager registreret i Arbejdstilsynet
- Eksportvejledning med lokal kontaktperson
- Senest brugte indberetninger
- Mulighed for at abonnere på diverse typer ændringer i virksomheder, fx ledelsesændringer
- Brugerrettighedsadministration af adgang til indberetninger på Virk og fuldmagter til fx revisor

Mit Virk præsenteres i et såkaldt responsivt design, der tilpasser sig både desktopcomputere og mobile enheder. Virksomheder kan således i dag også benytte Virk på farten med deres mobiltelefon eller tablet. Interaktionsdesignet er tillige dynamisk, så brugere kan deaktivere en udvalgt tjeneste på Mit Virk, de ikke finder relevant, og aktivere den igen, hvis situationen ændrer sig.


Forløb

De første udgaver af Mit Virk, 1.0 og Mit Virk 1.1, havde til mål at etablere en basisversion af Mit Virk med centrale tjenester som kalender og digital post. Derpå gennemgik Virk-plattformen en omfattende forandring med etablering af tre vertikaler (Indberet, Data og Startvækst), hvilket gav et nyt og væsentligt bedre fundament for udvikling af Mit Virk. Fx blev det muligt at udvikle et Mit Virk til mobile enheder.

I punktform forløb udviklingen således:

- Primo 2012 til medio 2012: Forundersøgelse vedr. Mit Virk i Erhvervsstyrelsen, der mundede ud i beslutning om at udvikle Virk i etaper i agilt tilrettelagte projekter
- Medio 2012 til ultimo 2012: Mit Virk 1.0 med første version af kalender, beskedboks og integration til Arbejdstilsynet udviklet og sat i drift
- Primo 2013 til medio 2013: Mit Virk 1.1 med ny version af beskedboks og kalender udviklet og sat i drift sammen med adgang til regnskaber i bla. XBRL (strukturerede data) og pdf
- Ultimo 2013 til medio 2014: Ny open source-plattform udviklet og sat i drift
- Medio 2014 til ultimo 2014: Mit Virk 2.0 med nyt interaktionsdesign og nye integrationer til Arbejdstilsynet, Erhvervsstyrelsen og kalender og beskedboks udviklet og sat i drift

- Medio 2015 til ultimo 2015: Mit Virk 3.0 udviklet og sat i drift. Brugere fik derved følgende ydelser:
 - Ny integration til Arbejdstilsynet og widget med visning af registreringsoplysninger
 - Ny integration til CVR og ny widget med visning af virksomhedsoplysninger og regnskaber
 - Ny version af abonnentmenstjenesten Følg virksomhed
 - Ny sektion på Myndighedsnet til myndigheder, der bruger kalenderen på Mit Virk, og ny version af kalender til virksomheder på Mit Virk
 - Versionering af Mit Virk til virksomheder, der logger på med NemID privat

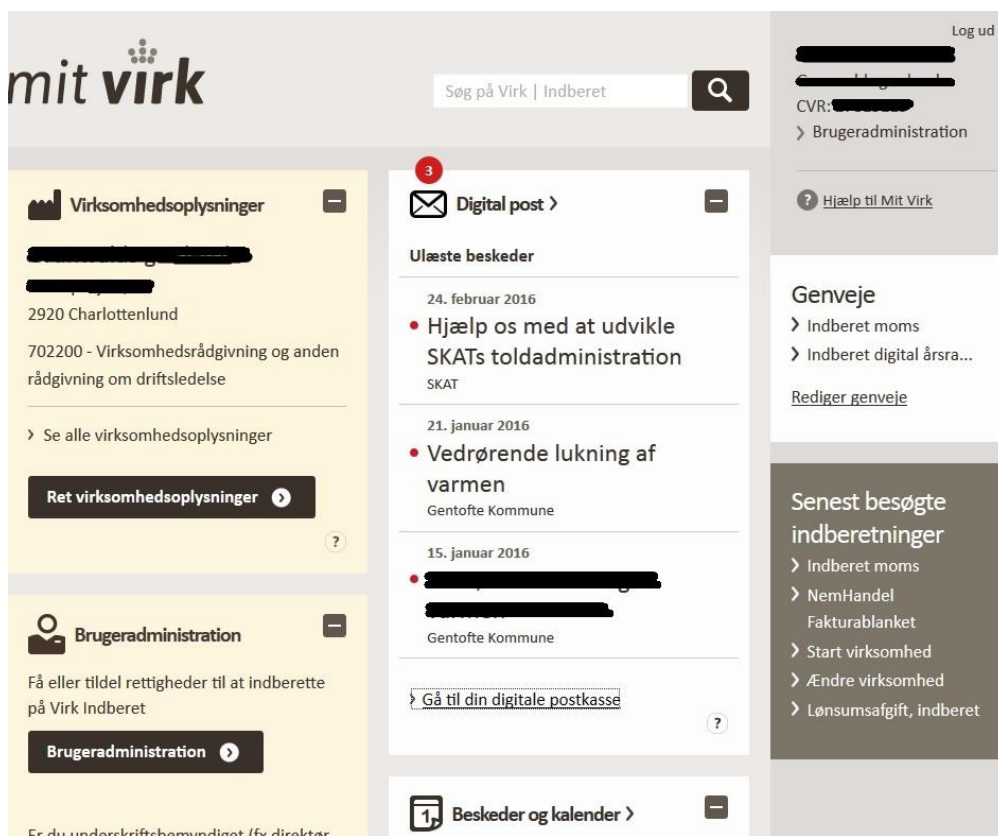

Figur 1: Et eksempel på Mit Virk (udsnit, anonymiseret), som en enkeltmandsvirksomhed møder

Økonomi

Nedenstående tabel viser det økonomiske forbrug. Forbruget fordeler sig på analyse, design, udvikling, test, drift og afskrivninger mv. af it-løsninger i perioden 2011 til 2015.

Det skal bemærkes, at der i denne periode er givet bevilling til basisdrift af Virk samt en række særskilte udviklingstiltag på Virk, herunder Mit Virk. Drift og udvikling af Virk er sket inden for rammerne af handlingsplanen for Virk

2013-15, som blev vedtaget af styregruppen for Virk. Med denne handlingsplan blev det besluttet, at det nuværende Virk består af tre vertikaler – Virk Indberet, Virk Data og Virk StartVækst – hvor alle de tidligere særskilt finansierede udviklingstiltag er integreret. Der er således i perioden foretaget udviklinger og forbedringer af portalen, som både understøtter Mit Virk og anden funktionalitet på Virk, som er en forudsætning for det personaliserede univers. Nedenstående forbrugstal tager dermed udgangspunkt i en skønnet fordeling af udgifterne til Virk ift., hvilke udviklings- og driftsudgifter som primært eller delvist understøtter funktionaliteten bag Mit Virk. Forbruget er således væsentligt højere end den direkte finansiering til Mit Virk og indebærer, at der udover den særskilte bevilling til Mit Virk er prioriteret midler fra basisbevillingen til Virk for at udvikle og drifte den funktionalitet, der ligger i Mit Virk, og som i dag er en del af det integrerede Virk med tre vertikaler. Dette skal endvidere ses i sammenhæng med, at det personaliserede univers står for ca. 25 pct. af trafikken på Virk. Alle investeringer er afskrevet inden for perioden.

	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
EVM egenfinansiering	11,3	11,0				22,3
Digitaliseringspuljen			4,0	4,0	4,0	12,0
Forbrug – drift		0,7	4,9	8,2	15,3	29,1
Forbrug – lønsum		2,1	9,3	9,0	9,0	29,4
Rest	11,3	8,2	-10,2	-13,2	-20,3	-24,2

Fremtidigt ejerskab

Virk-universet, herunder Mit Virk, applikationsforvaltes af Erhvervsstyrelsen i løbende samarbejde med erhvervsrettede myndigheder, der er på Virk. Beslutninger af mere strategisk karakter vedrørende Virk og Mit Virk drøftes desuden på møder med Interessentgruppen for Virk med deltagelse af erhvervsorganisationer og Styregruppen for Virk med deltagelse af myndigheder. Derudover rapporteres der årligt til regeringens økonomiudvalg om Virk-universets status og integrationens fremdrift.
